



はじめてのチーフのための 大会運営テキスト

先輩たちが書いた3冊の「大会運営の本」を読み比べてわかった、
大会を失敗させないための7つのレッスンと、「大会運営の全体像」

対象：初めて大会運営のパートチーフ（責任者）を任された大学2年生

元になった3冊：①池ヶ谷悦朗「大会運営学」（1994） ②西村徳真「大会運営のプロジェクトマネジメント」（2020）
③坂野翔哉「オリエンテーリング大会開催マニュアル」（2017） / このテキストは3冊の内容を要約・再構成したもので
す。

はじめに ― このテキストの使い方

「来年の大会、スタートのチーフをよろしく」。そう言われたとき、あなたの頭に浮かぶのは、たぶん当日の光景でしょう。スタート枠に選手を並べて、時計を読み上げて、地図を渡して……。でも、先輩たちが書いた3冊の本は、口を揃えてこう言っています。**大会の成否は、当日ではなく、そのずっと前に決まっている、と。**

このテキストは、オリエンテーリングの大会運営について書かれた3冊の本を読み比べ、「3冊とも同じことを言っている部分」を7つのレッスンにまとめたものです。書かれた年代も、著者の立場もバラバラなのに、同じ結論にたどり着いているところは、きっと大会運営の「変わらない部分」です。まずそこを押さえましょう。そのうえで、3冊それぞれの「得意技」と、1年間のどの時期にどの本を開けばいいかを紹介します。

登場する3冊




① 大会運営学

「考え方」の本

早大OC OBでサン・スーシの池ヶ谷悦朗さんが1994年に雑誌O-Japanに連載（全7部。第4部『『超』調査論』だけWeb未公開）。早大OC大会を15回運営した経験から、「なぜ失敗するのか」「大会をどう育てるか」を論じた方法論の本。個別の手順は書かず、ものの見方を教えてくれる。

<https://w-score.github.io/>



② 大会運営のプロジェクトマネジメント

「チームの回し方」の本

西村徳真さんが2020年に京都府協会の研修会で使ったスライド。ソフトウェア開発の考え方を借りて、「準備をどう進めるか」「メール地獄にならない組織をどう作るか」を説く。

https://nishipro.com/file/project_management.pdf



③ オリエンテーリング大会開催マニュアル

「手順と数字」の本


マッパーの坂野翔哉さんが2017年に書いた29ページの手引き。トレイン探しから撤収まで時系列で、費用の相場や必要人数まで具体的な数字つき。ゼロから大会を開く人向け。このテキストでの引用は著者の了解を得ています。

http://www.orienteering.com/~uofj/media/documents/20190223-competition_manual_20180810.pdf（このURLでの公開は2026年9月に終了予定）

ちょっと補足。「パートチーフ」とは、スタート・フィニッシュ・計算センター・給水救護・会場といった「パート（部署）」の責任者のこと。上には実行委員長・運営責任者（運営）・競技責任者（競責）の「3役」がいて、あなたはその下で自分のパートの計画・人・モノ・当日の動きを預かります。3冊の教えは、実行委員長向けに書かれた部分も多いのですが、このテキストでは「パートチーフならこうする」に翻訳してあります。

第1章 3冊が口を揃えて言うこと —— 7つのレッスン

1 大会は「当日」ではなく「準備」で決まる

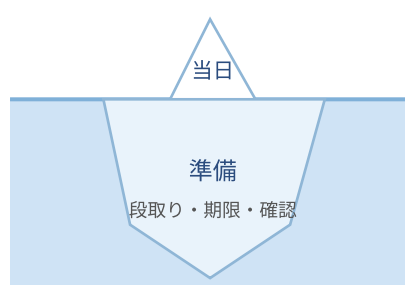

見えている当日は氷山の一角

3冊とも、出発点はここです。①は「大会の開催を決めた瞬間に、いろいろな作業の期限は実はもう決まっている」と言います。プログラムを出す日が決まれば、コースも会場もそれまでに確定していなければならない。つまり、期限は自分で決めるものではなく、与えられるものなのです。②は準備の進め方そのものを「プロジェクトマネジメント」と呼び、③は当日の章の冒頭で「大会の成功はどれだけ準備できたかにかかっている」と言い切ります。

- ① 期限は「与件」。期限までに全部やるための段取りが最重要課題
- ② 「準備の積み上げ」が基本方針の一つ。準備を計画的に進める
- ③ 現地でなくてもできることは、できるだけ事前にやってしまう

パートチーフならこうする

- 「要項1発表」「要項2発表」「プログラム発表」「現地入り」の日付を最初書き出し、逆算して自分のパートの締切を決める
- 当日の役割分担より先に、「当日までに何を作っておくか」のリストを作る

2 一度発表したことは変えない



出したら鍵をかける

①が第1部で最初に挙げる問題提起が「発表することの重大さ」です。模擬店の中止、スタート地区への到着時刻の変更——一度外に出した情報を変えると、参加者はそれを前提に予定を組んでいるので、大きな迷惑をかけます。だから、発表する前に中身を完全に固めておくこと。③はこれを実務のルールにしています。「スタートリストもプログラムも、掲載後は原則更新してはならない。特にスタート時刻は変えてはならない」。②は参加者向けではなく運営内部の話ですが、「議論ではなく決定事項」を紙に固定し、誰でも参照できるようにせよ、という同じ発想です。

- ① 発表前に確定させる。「見切り発車」が迷惑の元
- ② 決まったことは「コアペーパー」に書いて固定し、共有する
- ③ 掲載後にどうしても直すときは、変更箇所をハイライトし、公式掲示板でも告知する

パートチーフならこうする

- プログラムに載る自分のパートの情報（スタート地区までの距離、誘導テープの色、給水の位置など）は、原稿締切より前に競責・運責と読み合わせて確定する
- 「たぶんこうなる」を原稿に書かない。決まっていなければ決めてから書く

3 「誰が・何を・いつ」を落とさない

	計画	準備	開催	事後
スタート	✓	✓		
ゴール	✓		?	
計セン		✓		
総務	✓			

分野×工程の表で「空欄」を探す

①は失敗の主因を「作業の漏れや手順の誤り」だと見ています。有名なエピソードが、大会前日にスタートチーフが「歩測区間作るの、忘れたっ！」と叫んだ話。マニュアルには立て看板の仕様まで書いてあるのに、「歩測区間を作る」という作業そのものが載っていなかったのです。そこで①は、縦に「分野」（スタート、ゴール、計算センター、それに人事・総務・会計といった裏方）、横に「工程」（計画、準備、開催、事後、評価）をとった表に、必要な作業を全部書き出すことを提案します。実際にやってみたら約900項目になったそうです。


②は同じ問題を「責任」の側から解きます。一つの作業には責任者が一人（単一責任の原則）。同じことを二つの書類に書かない（DRY原則）。二か所書いてあると「どっちが正しい？ 誰がやる？」が曖昧

味になるからです。③は「担当者を明確にしておく」「撤収割に振り忘れることが多いので注意」と、漏れやすい場所を一つひとつ指差しています。①の第4部にも同じ話があります。大人数で地図調査をすると誰がどこを調査したか分からなくなり、その匿名性への甘えが手抜きを生む。だからグループごとの分担図を地図に載せて、責任者の名前を出す、と。

パートチーフならこうする

- 自分のパートの作業を「準備中／前日／当日朝／競技中／撤収」に分けて全部書き出す。当日の作業だけ書いて満足しない
- 各作業に担当者を一人だけ書く。「みんなで」は誰もやらないのと同じ
- 資材リストを作り、「作る／事前に買う／現地で買う」に分類する (③)

4 パートとパートの「つなぎ目」を先に決める

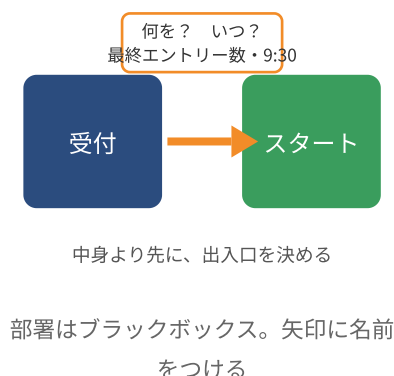


①の第3部に、こんな話があります。受付班は「最終スタート時刻」をスタート班に知らせる計画だったのに、スタート班が本当に必要としていたのは「最終エントリー数」だった。前提の情報が来ないので、スタート班が用意した段取りは丸ごと動かなくなった——。①はこれを「インターフェースミス」と呼び、マニュアルの欠陥の中で最も重大なものだと言います。だから、各パートの中身を作り込む前に、パート同士の間で「何を・いつ・どちらへ渡すか」を先に決めよ。地図調査で隣の担当と「境界合わせ」を先にするのと同じだ、と。

②はこれを「密結合」から「疎結合」へ、と表現します。全員が全部のメールを読まないといけない状態（密結合）ではなく、責任者ごとに決定事項が紙にあって、それを見れば動ける状態（疎結合）にする。申込受付→競技責任者→資材担当、という情報の流れを設計しておく。③は申込データを例に、パートごとに別々のリストを持つと「計算センターのデータと公開したスタートリストが違う」事故が起きると警告しています。3冊とも申込データを例に挙げているのは偶然ではなく、ここが一番情報の受け渡しが多い場所だからです。

パートチーフならこうする

- 「自分のパートに入ってくるモノ・情報」と「出ていくモノ・情報」を、相手パートと時刻つきで紙に書き、相手チーフとすり合わせる
- エントリーリストは自分でコピーを作らない。「誰が管理している1つのファイル」を見に行く

5 進み具合と出来ばえを、定期的に検査する



終わったマスに塗る。空白と「速すぎ」を疑う
進み具合を、目で見えるようにする

①には、このテキストの元になった連載のうちWebに出ていない第4部『『超』調査論』があります。大人数の学生で地図調査をしていた時代の話なので、今の地図作り（レーザー測量の基図、OCAD、プロへの委託）とは前提が違いますが、そこに書かれている「考え方」は、パートの仕事にそのまま使えます。集団で調査すると必ず起こる問題が二つある。締切を過ぎてから、まるで進んでいなかったことが分かる。あとで見たら、使い物にならない調査だった。どちらも「発見が遅すぎる」のが問題だから、**早期発見、早期治療**——そうなる前から、進み具合と出来ばえを定期的に検査する仕組みを作れ、というのが第4部の主張です。

道具は簡単で、250m四方のマス目を描いた地図を用意し、終わったマスを蛍光ペンで塗っていく。進んでいなければ、さぼっているか悩んでいるかだから、応援をつけるか担当を替える。逆に「やけに速い」ときも喜ばず、手抜きを疑う。第2部のマトリクスの「消化率」と同じ道具の、調査版です。③は同じことを実行委員長の仕事として書いています。「すべての仕事をチェックし、遅れていたら指摘しなければならないが、どうしてもヤバイ時はまるごと肩代わりすることになる。絶対にどこかで誰かが滞る」。②も、実行委員長・運責・競責は全部のやり取りを見て抜け漏れと矛盾をチェックする、と最上層の役割を定めています。

- ① 早期発見、早期治療。進捗と精度を定期検査する。速すぎる進捗も疑う
- ② 最上層（実行委員長・運責・競責）が全やり取りを監視し、抜け漏れと矛盾を拾う
- ③ 絶対にどこかで誰かが滞る。チェックして、指摘して、最後は肩代わり

パートチーフならこうする

- レッスン3で作った作業リストに「済」欄を付け、週に一度、自分で塗る。空白が並んでいる担当者に声をかける
- 「もうできました」と早く上がってきた成果物ほど、中身を見る（③の言う競責・EAのチェックと同じ）
- 締切の前に「途中でいいから見せて」と言う。締切の日初めて見るのが一番危ない

6 記録して、次の人に渡す



終わった直後に赤ペンで直す

①第5部は「巻き尺がない!」という小さな事件から始まります。掘り下げると、マニュアルの不備、反省会の不足、引き継ぎの問題という構造的な原因が隠れていた。スタートリストの左右が逆になるミスは、15年の歴史で何度も繰り返されていた。①の結論はこうです。「経験を確実にモノにしよう。そうすれば運不運や個人差の影響を最小限に抑えることができる」。具体的には、大会が終わったらすぐ赤ペンでマニュアルを直す、報告書は「ありのまま」を書く、報告書とマニュアルを一冊にまとめて配る。しかも反省は後ろ向きではなく、改善が目に見える「創造的なプロセス」だと言います。

- ① データを取ろう。「データがないと問題があること自体に気がつかない」。第4部では会場に地図のクレーム窓口を置き、白地図に書いてもらう。第5部の結びの格言「海岸の難破船は…」は、ソフトウェア工学の古典『人月の神話』（旧訳『ソフトウェア開発の神話』）第1章の章扉から。第4部の「延べ人数という魔物」も同書第2章の章題
- ② コアペーパーは更新し続ける記録。新メンバーにはキックオフで進め方を共有する
- ③ パートチーフは引き継ぎ文書をもとにパートマニュアルを作る。最後は「引き継ぎや反省を書いて次に引き継ぐ」

パートチーフならこうする

- 前年のパートマニュアルをもらい、まず「今年と違うところ」に印をつけることから始める
- 当日は困ったこと・うまくいったことをその場でメモ。大会翌週のうちにマニュアルを直して、来年のチーフに渡す
- スタート枠の処理時間や読み取り所の待ち人数など、数えられるものは数えておく

7 チーフは「作業する人」ではなく「決めて、伝える人」



「このパートはこうする」を言葉にする

旗を持って、方向を示す

3冊の実行委員長像は、言い方は違っても同じところを向いています。①は「戦略的大会運営」——どんな大会を目指すかを言葉にして、内にも外にも宣言することを勧めます。早大OC大会の「Orienteer Oriented —— 喜ばれる大会をつくりたい」がその例。②は実行委員長が「謝罪要員」になりがちだと指摘し、本来は理念と仕様の最終責任者、プロデューサーであるべきだと言います。③はもっと直接的で、「運営者が20人を超える頃から、大会責任者は何もしないことが仕事になってくる」。仕事 came たら自分以外に振り、誰が何をしているか把握するのが役目だ、と。

これはパートチーフにも当てはまります。自分が一番手を動かすのではなく、パートの方針を決めて、メンバーに伝え、抜けを見つける人になる。②の「コミュニケーション・レイヤー」では、パートチーフの責任は「自分のパートに関係する事項を確実に把握し、発信すること」と定義されています。

パートチーフならこうする

- 「今年のスタートは〇〇を大事にする」と一言で言えるようにしておく（例：「遅刻者を出さない」「一人当たりの待ち時間を短く」）
- 当日の自分の持ち場は「動ける場所」にする。1分前枠に張りつくとも全体が見えなくなる
- 連絡は原則チーフ同士・重役との間で行う（③）。メンバーが勝手に他パートと交渉しない仕組みにする

おまけ：3冊が共通して大事にしている、もう一つのこと。それは「地元」です。①は「地元の下承なしに大会は開けない」と言い、③は役所や地区の会合で説明し、菓子折りを持って挨拶し、終わったら礼状を書く、という手順まで書いています。③にはこんな警告も。試走中に偶然会った地元の方に、運営者がオリエンテーリングと大会の説明をできないと、最悪の場合、大会が開けなくなる。**パートチーフも、聞かれたら大会の概要を自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。**

第2章 3冊はどう違う？——それぞれの得意技

同じことを言っている部分を見てきましたが、3冊はそれぞれ「見ている高さ」が違います。①は上空から全体を、②はチームの中の配線を、③は地面の手順を見ています。困ったときにどの本を開くかは、この違いで決まります。

① 大会運営学

上空から見：なぜ失敗するのか、大会をどう育てるか
作業の全体表・インターフェース・記録と反省・コンセプト


② PM研修資料

チームの中を見る：責任・決定事項・連絡の流れをどう設計するか
コアペーパー・単一責任・疎結合・人数を増やさない・仕様を増やさない

③ 開催マニュアル

地面を見る：いつ・何を・いくらで・何人で
渉外・申請・要項1/2・資材リスト・パート割・中止基準・調査依頼と提訴

① 大会運営学 —— 「そもそも」を考えさせてくれる本



矢印で「結果待ち」を見える化


①だけの特長は、大会運営を一つの「システム」として丸ごと捉えるところです。作業を全部書き出す表（マトリクス）を作ったら、次はそれを矢印でつないで「どの作業がどの結果を待っているか」を図にする。コースが確定しないとプログラム原稿が書けない、試走が終わらないとコースが確定しない……この依存関係を全員で共有すれば、遅れの影響範囲が見えます。3冊の中で、作業同士の関係を図にしようと提案しているのは①だけです。

もう一つは「育てる」視点です。第6部では、アイデアは「ニーズ（困りごと）」と「シーズ（種になる技術やモノ）」の出会いから生まれ、資質ではなく普段の努力の産物だと説き、第7部では、アイデアは局地的な戦術にすぎず、大会全体の「コンセプト」があって初めて活きる、と論じます。②③が「今年の大会を無事に終える」ことを目指しているのに対し、①だけが何年にもわたって大会に個性を与え、伝統を受け継ぎながら新しくしていく話をしています。

「大会のマニュアルは、マニュアル兼『大会の設計図』」。ところが既存のマニュアルは「各部屋の内装ばかりが描かれ、満足な見取り図や外観図がなかった」。

——①第3部の比喻。パートマニュアル（内装）の前に、パート間の見取り図を、という意味

② 大会運営のプロジェクトマネジメント —— 「メール地獄」からの脱出法



議論の輪から、決定事項の参照へ

②の中心は「コアペーパー」です。責任者ごとに一枚ずつ持つ「決定事項と暫定計画の紙」で、運賃ならガントチャート、競賃なら設置計画図、資材担当なら備品リスト、人事担当ならタイムテーブル、申込担当ならエントリーリスト。②は、メールのやり取りで疲れ切ってしまう原因を「全員で議論しないと進まない密結合状態」にあると診断し、各自が決定事項を見れば動ける「疎結合状態」への転換を勧めます。コミュニケーションとは、突き詰めれば「コアペーパーの更新作業」だ、と。クラウド（OneDrive・Googleドライブなど）に置いて常に最新版を見られるようにすること、表や図の形で整理することも実装のコツとして挙げています。

もう一つ②だけの主張が「増やさない」です。人数を増やすと連絡コストが膨らみ、無責任にもなる（ブルックスの法則）。仕様を増やすと負担が指数関数的に増える（KISS原則）。スタート地区の分割、複数縮尺、複雑な表彰、バス輸送……「本当に要る？」と一度立ち止まれ、という引き算の発想は、①③にはありません。メール・Slack・LINE・Zoomの使い分けを評価しているのも②だけです。

③ オリエンテーリング大会開催マニュアル —— 数字と手順が全部ある本

要項1→要項2→プログラム



相場・人数・時間が書いてある

③の特長は、とにかく具体的なことです。トレインの広さと縮尺、地図作成の1ヘクタール当たりの単価、公民館の借用相場、傷害保険の一人当たりの単価、インクジェットプリンタ1台で1時間に刷れる枚数とミス率、シーリングの速度、ハイエースのレンタル料、暑さ指数（WBGT）31℃以上なら中止、雷が鳴ったら中止——こうした数字は、経験した人にしか書けません。数百人規模の大会で当日に必要な人員（会場・スタート・フィニッシュ・計算センター・給水救護で30人前後）を役割つきで書いてくれているのも③だけです。

それから、①②が扱わない「開催判断より前」の世界。トレイン探し、土地所有者の把握の難しさ、「版權」という暗黙の了解、日本学連の新規地図作成事業、都道府県協会や地区学連への申請、イベントアドバイザーの探し方、企画書に書くべきこと。そして当日の安全と公正の制度——中止の判断基準、「調査依頼と提訴」の仕組み、裁定委員の依頼方法。競技規則の要項・プログラムの必須記載事項を引いているのも③だけです。

③の「数字帳」——原文から、パートチーフが使う数字だけ抜き書き

- ・当日の人員（数百人規模の最低限）：会場は3役＋アドバイザー4名のほかに会計・受付で4～5人、スタート7人（レーン数＋3人が最低限）、フィニッシュ4人、計算センター3人、給水救護4人。合わせて30人ほど

- ・事前準備の速さ：インクジェット1台で地図は毎時20～30枚、ミスは1～3%。「何があってもファイルを分けない。一度に、一気に刷る」。シーリングは早い人で毎時100枚、普通の人で30～40枚。ゼッケンはレーザーで毎時300枚、耐水紙は1枚25～40円

- ・設置と確認：設置は2人1組、全部で2時間は見込む。全確は競走とEAが2人1組で40～60コントロールを回り、10km・3～4時間

- ・保険：大会当日だけの傷害保険が参加者・運営者1人1日20～100円

- ・中止の判断：気象庁の予報は5時・11時・17時。中止なら5時10分までにHPで連絡。雷が鳴ったら中止、大雨警報・暴風警報は中止、暑さ指数（WBGT）31℃以上は中止、熊が出たら中止、蜂はコース短縮

- ・撤収で振り忘れやすいもの：スタートフラッグと、スタート地区からフラッグへの誘導（競技終了まで撤収してはならない）

——③第2章「人員割振」「事前準備」、第3章「前日の日中までに現地でやること」「安全性の確保」「開催判断」「撤収」より

「パズルのように人と資材を組み合わせ、必要なときに必要な人や物が適切な位置に存在できるよう調整した計画立案をするのが運営責任者の醍醐味」

——③第2章「現地入りスケジュールの作成」。①のネットワーク図も②のタイムテーブルも、最後はこの一枚の表になる


困ったとき、どの本を開く？

こんなとき	開く本	見るところ
パートの作業リストを作りたいが、何を書けばいいかわからない	③ → ①	③の第2・3章で作業の実体を拾い、①第2部のマトリクスの考え方で「工程」を分けて漏れを探す
他パートとの連絡がかみ合わない、情報が来ない	①	第3部「インターフェースをまず決める」
グループのメールやLINEが多すぎて何が決まったかわからない	②	コアペーパー、密結合と疎結合、ツール別の使い分け
費用や人数の見積もりがほしい	③	第1章「会計」、第2章「人員割振」「資材の確保」
当日、天気が悪そう。中止の判断は？	③	第3章「開催判断」（予報の発表時刻、警報、WBGT）
締切直前になって「実は進んでいなかった」が判明した	①	第4部「チェックとフォローの体制」「進み具合をチェックする」
去年と同じ失敗を繰り返してしまった	①	第5部「記録と反省」
「今年の大会はどんな大会にする？」と聞かれた	①	第6部「アイデア」、第7部「コンセプトとアイデンティティ」
やりたいことが多すぎて手が回らない	②	「仕様の単純化」「人数の適正化」——増やさない勇氣

第3章 パートチーフの1年 —— 「大会運営の全体像」で見る

最後に、1年の流れの中で、7つのレッスンと3冊をどう使うかを並べます。土台にするのは、次のページの「大会運営の全体像」です。これは①の著者が2026年に、①の「工程」の考え方（カレンダーの日付ではなく、「要項発表」「プログラム発表」「現地入り」といった運営上の節目で区切る）が、現在のイベントディレクタ研修教材に載っているワークフローときちんと整合することを確認するために作った一枚の表です。左半分が①の工程、右半分が研修教材のワークフローで、あなたがこれから出会う言葉——ブレティン、イベントアドバイザー、点検・承認——がそのまま出てきます。

図の読み方 —— 3つのポイント

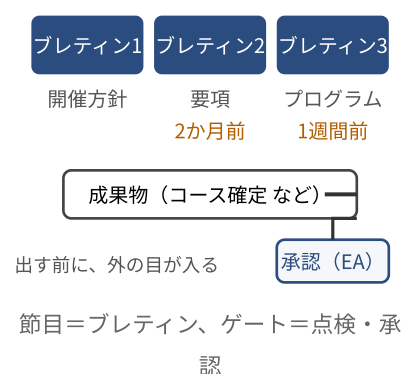

1. 節目は「ブレティン」で数える。ブレティン1は計画書（開催方針）、ブレティン2は要項（2か月前まで）、ブレティン3はプログラム（1週間前まで）。③が「要項1・2・3」と呼んでいたものと同じで、期限は競技規則で決まっています。つまり、レッスン1の「期限は与えられるもの」の中身がこれです。なお図にある「ブレティン1.5」（要項発表前に大会をアピールする段階）は、第45回サン・スーシ大会の実態に合わせて書き足したもので、どの大会にもあるものではありません。

2. 「公開情報」の列は、レッスン2の実体。どの段階で何が外に出るか——開催方針だけ、次に競技概要とエントリー情報、次に競技詳細と当日の周知事項、当日は地図とコース、事後に最終成績——と、公開される情報が段階的に細かくなっていきます。大会規模は要項の段階まで「未定」、プログラムの段階で「確定」。自分のパートの情報がどのブレティンに載るのかを知っておけば、いつまでに何を確定させるべきかが分かります。

3. 橙色の枠と、右側の「点検」「承認」は、後戻りできないゲート。橙色の枠（要項、コース確定、プログラム、公式記録）は外に公開される成果物で、ここを過ぎると後戻りできません。だから今日では、イベントアドバイザー（EA）がチェックする対象にもなっています。コース印刷やコントロール設置も点検・確認を受けます。あなたのパートの成果物も、このゲートのどこかを通ります。レッスン3・4で「担当を決める」「つなぎ目を決める」をやった先に、レッスン5の「誰が、いつ検査するか」が仕組みとして決まっている、ということです。

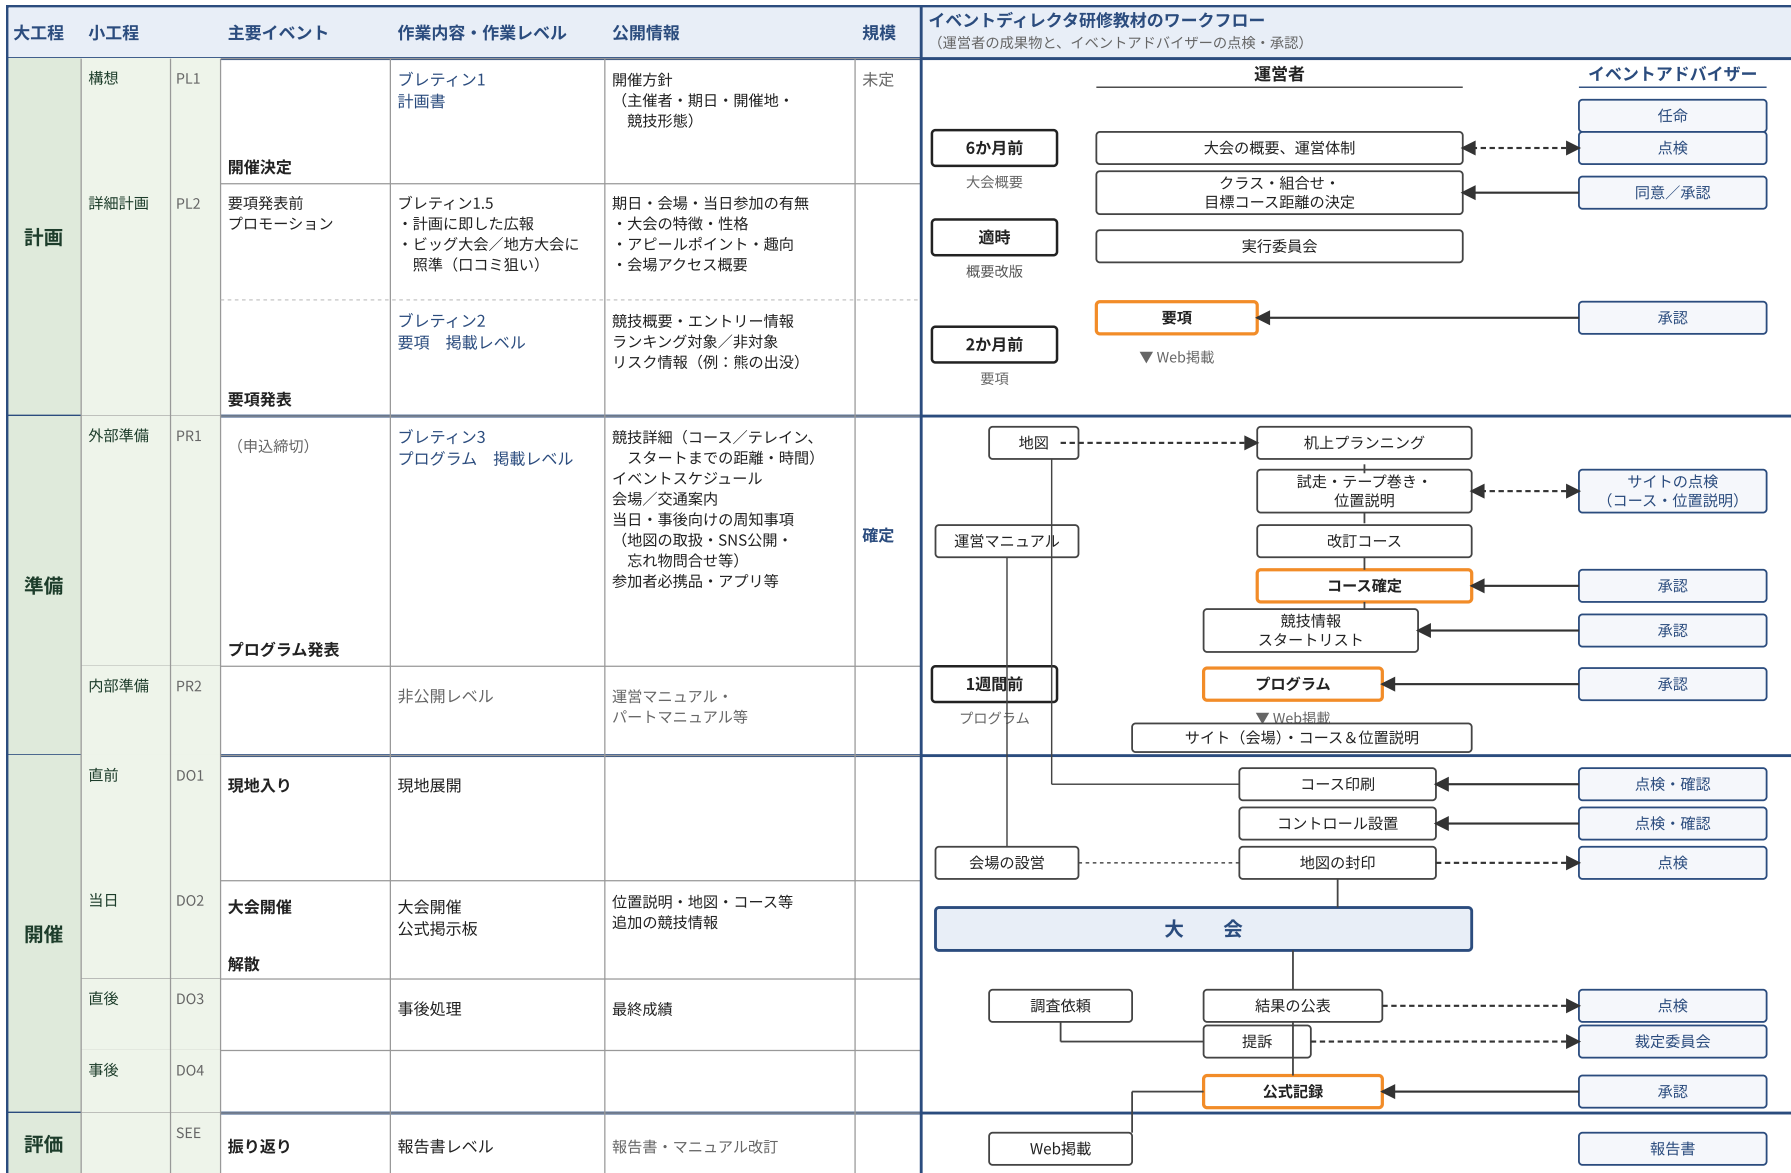


図 大会運営の全体像 ― ①「大会運営学」の工程（左）と、イベントディレクタ研修教材のワークフロー（右）

池ヶ谷悦朗「大会運営全体像」（2026年7月）をもとに、本テキストの体裁で描き直したもの。かつてのO-Japan「大会運営学」の工程定義と、イベントディレクタ研修教材に記載のワークフローとの整合が取れることを確認した資料で、右側のワークフローの内容は研修教材による。橙色の枠は公開される成果物＝ここを過ぎると後戻りできない不可逆的なポイントで、今日ではイベントアドバイザーのチェック対象でもある。「プレティン1.5」は第45回サン・スーシ大会の実態に合わせて追記したもので、一般的なものではない。

工程ごとに、チーフがやること

図の左の「工程」に沿って、7つのレッスン（L1～L7）と3冊の使いどころを並べます。日数の目安は③によるもので、300～500人規模の大会なら半年前、100人規模なら2～3か月前から参加者募集の話が始まります。

計画（PL1・PL2） 開催決定～ブレティン2（要項）

前年のパートマニュアルと報告書をもらって読む（L6）。運責からブレティン1・2・3と現地入りの日付を聞き、自分のパートの締切を逆算する（L1）。下見や試走にはできるだけ参加する。③いわく「現地を見ることで、大会をもっと工夫できることがはっきり分かってくる」。要項に載るパートの情報（スタート地区の場所など）は、この段階でEAの承認を通ります。

準備・外部（PR1） 要項～ブレティン3（プログラム）

パートの作業を工程ごとに全部書き出し、一つひとつに担当者を置く（L3）。隣のパートと「何を・いつ・どちらへ」を紙ですり合わせる（L4）。②の言う「コアペーパー」を、パートの単位で一枚持つイメージです。資材リストを作り、必要人数を確定する。③の目安では、スタート地区は「レーン数+3人」が最低限。作業リストの消化率を週に一度は見て、遅れている作業に手を打つ（L5）。プログラムに載る自分のパートの記載を競責と読み合わせて確定する（L2）——ここがEAの承認を受ける最後の公開情報です。

準備・内部（PR2） プログラム発表～現地入り

プログラムは出したら変えない（L2）。ここからは「非公開レベル」の準備、つまりパートマニュアルの仕上げです。メンバーに読んでもらい、前日までにシミュレーションをして、各自が当日の動きを覚える（③）。パートの方針を一言で伝えておく（L7）。

開催・直前（DO1） 現地入り

設置、全コントロール確認（全確）、地図の封印、会場の設営。図の右側にあるとおり、コース印刷とコントロール設置はEAの点検・確認が入ります。設置したものは全部記録しておき、撤収の担当を割り振る（L3）。

開催・当日（DO2） 大会開催～解散

朝の確認（朝確）から始まり、公式掲示板で追加の競技情報を出す。チーフは動ける場所において、連絡はチーフ同士・重役との間で（L7）。困ったこと、うまくいったことはその場でメモ（L6）。撤収では「スタートフラッグと、スタート地区からフラッグへの誘導は競技終了まで撤収してはならない」（③）——振り忘れの定番です。

開催・直後～事後（DO3・DO4） 結果の公表～公式記録

結果の公表、調査依頼・提訴があればその対応（③）、公式記録の承認とWeb掲載。パートとしては、借り物の資材を洗って数えて返し、立替金の精算をする。

評価（SEE） 振り返り

翌週のうちに、赤ペンでパートマニュアルを直す。取ったデータや数を書き添える。報告書には「ありのまま」を書く。そして来年のチーフに渡す（L6）。①の言葉を借りれば、これが「情報の子孫繁栄、種の保存」です。

付録1 パートチーフのチェックリスト

準備期間

- ☐ 前年のパートマニュアルと報告書を読んだ
- ☐ 要項1・要項2・プログラム・現地入りの日付を知っている
- ☐ パートの作業を工程別に全部書き出した
- ☐ すべての作業に担当者が一人ついている
- ☐ 隣のパートとの「入ってくるもの／出ていくもの」を時刻つきで確認した
- ☐ 資材リストを作り、「作る／事前購入／現地購入」に分けた
- ☐ 必要人数を出し、運賃に伝えた
- ☐ 作業リストの「済」欄を週に一度チェックしている
- ☐ プログラムに載る自パートの記載を競責と読み合わせた
- ☐ パートマニュアルをメンバーに配り、シミュレーションをした

当日・事後

- ☐ パートの方針を一言でメンバーに伝えた
- ☐ 自分は「動ける場所」にいる
- ☐ 設置したものをすべて記録し、撤収の担当を割り振った
- ☐ 困ったこと・うまくいったことをメモした
- ☐ 数えられるもの（処理時間、待ち人数など）を数えた
- ☐ 翌週のうちにマニュアルを赤ペンで直した
- ☐ 報告書に「ありのまま」を書いた
- ☐ 来年のチーフに渡した

付録2 3冊に出てくる言葉のミニ辞典

工程 (①) 暦日ではなく「要項発表」「プログラム発表」「現地入り」といった運営上の節目で区切った時間の区分。計画・準備・開催・事後・評価の5段階。

作業マトリクス (①) 縦に分野、横に工程をとって、必要な作業を全部書き込んだ表。漏れを見つける道具。

ネットワーク図 (①) 作業を矢印でつなぎ、「どの作業がどの結果を待っているか」を示した図。PERTという工程管理の手法に由来。

インターフェース (①) 部署と部署の接点。そこで受け渡すモノ・情報とその時刻。

早期発見・早期治療 (①第4部) 悪い結果が出る前から、進捗と品質を定期的に検査して手を打つこと。メッシュマップを蛍光ペンで塗って進捗を見える化する。

傾斜調査方式 (①第4部) 大会で使う重要な部分は念入りに、そうでない部分はそれなりに調べる優先度づけ。精度の低い部分はコースで避ける。

ニーズとシーズ (①) 困りごと（ニーズ）と、種になる技術やモノ（シーズ）。両方が出会ってアイデアが生まれる。

戦略的大会運営 (①) どんな大会を目指すかが内外に明確で、全部署がそれに向かって統一的に努力している状態。

コアペーパー (②) 責任者ごとに持つ「決定事項と暫定計画書」。議論ではなく、決まったことを書く紙。

密結合／疎結合 (②) 全員で議論しないと進まない状態／各自が決定事項を参照して動ける状態。

単一責任の原則・DRY (②) 一つの作業に責任者は一人。同じことを二か所に書かない。

KISS・ブルックスの法則 (②) 仕様はひたすらシンプルに。人を増やしても連絡コストで早くならない。

3役・重役 (③) 実行委員長・運営責任者（運責）・競技責任者（競責）が3役。調査・渉外・広報・会計の責任者を加えて重役。

要項1・2・3／ブレティン1・2・3 (③・全体像) 時と場所の公表（計画書）／申込受付の開始＝要項（2か月前まで）／プログラム（1週間前まで）。研修教材ではブレティンと呼ぶ。全体像の「ブレティン1.5」は第45回サン・スーシ大会に合わせた追記で、一般的なものではない。

PL・PR・DO・SEE (①・全体像) 工程の記号。計画（PL1構想・PL2詳細計画）、準備（PR1外部・PR2内部）、開催（DO1直前・DO2当日・DO3直後・DO4事後）、評価（SEE）。

点検・承認 (全体像) 運営者の成果物にイベントアドバイザーの目が入るゲート。公開されて後戻りできない成果物（要項・コース確定・プログラム・公式記録）は承認、コース印刷・コントロール設置は点検・確認。

EA（イベントアドバイザー） (③) 外部から招く監督役。旧称コントローラ。

全確・朝確 (③) 設置後に全コントロールを確認して回ること／当日朝に一晩経っても問題ないか確認すること。

調査依頼と提訴 (③) 参加者が競技の公正に疑義を出したときの手続き。裁定委員3名とEAが裁定する。

③からの引用・要約は、著者の坂野翔哉さんの了解を得ています（2026年9月）。①の第4部『『超』調査論』（O-Japan 1994年10月号）はWeb未公開のため、著者提供の原稿によります。「大会運営の全体像」は池ヶ谷悦朗「大会運営全体像」（2026年7月）およびイベントディレクタ研修教材のワークフロー図をもとに描き直したものの。その他のイラストはすべて本テキストのために描き起こしたものです。
