



給新手組長的 賽事營運教材

讀了前輩們寫的三份「賽事營運文件」之後整理出的、
讓賽事不失敗的7堂課，以及「賽事營運全貌圖」

對象：第一次被交付賽事營運「組長」（分組負責人）任務的大學二年級生

依據的三份文件：①池ヶ谷悅朗《賽事營運學》（1994） ②西村德真《賽事營運的專案管理》（2020）

③坂野翔哉《定向越野賽事舉辦手冊》（2017）／ 本教材是三份文件內容的摘要與重新編排。三份原始文件皆為日文，書名為譯者暫譯。中文（台灣）版由日文原版翻譯（2026年9月）。

前言——這本教材怎麼用

「明年的賽事，出發組的組長就交給你了。」被這麼一說的時候，你腦中浮現的，大概是比賽當天的畫面吧：把選手排進出發格、報時、發地圖……。可是，前輩們寫的三份文件異口同聲地說：**賽事的成敗，不在當天，而是在那之前很久就決定了。**

這本教材比較閱讀了三份談定向越野賽事營運的文件，把「三份都在說同一件事」的部分整理成7堂課。寫作年代不同、作者立場也不同，卻抵達同樣的結論，那一定就是賽事營運「不會變的部分」。先把這裡掌握住。接著再介紹三份文件各自的「拿手絕活」，以及一年之中哪個時期該翻開哪一份。

登場的三份文件




① 賽事營運學

談「思考方式」的文件

早稻田大學定向越野社OB、Sans Souci的池ヶ谷悅朗先生，1994年在雜誌《O-Japan》上的連載（共7部，只有第4部「超」調繪論未於網路公開）。以營運15屆早大OC賽事的經驗，討論「為什麼會失敗」、「怎麼把賽事培育起來」的方法論。不寫個別步驟，而是教你看事情的方法。

<https://w-score.github.io/>



② 賽事營運的專案管理

談「怎麼帶團隊」的文件

西村德真先生2020年在京都府協會研習會使用的投影片。借用軟體開發的思考方式，說明「籌備怎麼推進」、「怎麼建立不會陷入電子郵件地獄的組織」。

https://nishipro.com/file/project_management.pdf



③ 定向越野賽事舉辦手冊

談「步驟與數字」的文件


製圖師坂野翔哉先生2017年寫的29頁指南。從尋找賽區到收點撤場依時間順序排列，連費用行情和所需人數都有具體數字。給從零開始辦賽的人。本教材的引用已獲作者同意。

http://www.orienteering.com/~uofj/media/documents/20190223-competition_manual_20180810.pdf（此網址預定於2026年9月停止公開）

補充一下。「組長」指的是出發、終點、成績計算中心、補給救護、會場等各「組（部門）」的負責人。上面有執行委員長、營運負責人、競賽負責人這「三大幹部」，你在他們之下，負責自己這一組的計畫、人、物，以及當天的運作。三份文件的教導有不少是寫給執行委員長的，但這本教材把它們翻譯成了「如果你是組長，就這麼做」。

第1章 三份文件異口同聲說的事——7堂課

1 賽事取決於「籌備」，不是「當天」

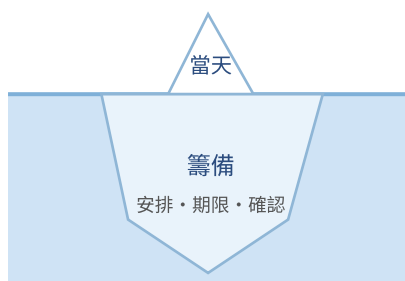

看得見的當天，只是冰山一角

三份文件的出發點都在這裡。①說「決定舉辦賽事的那一刻，各項作業的期限其實就已經定了」。發布賽事手冊的日期一定，路線和會場就必須在那之前確定。也就是說，期限不是自己決定的，而是被給定的。②把籌備的推進方式本身稱為「專案管理」，③則在當天那一章的開頭直言「賽事的成功，取決於準備了多少」。

- ① 期限是「既定條件」。在期限前把事情全部做完的安排，是最重要的課題
- ② 「籌備的累積」是基本方針之一。有計畫地推進籌備
- ③ 不必在現場也能做的事，盡量事先做完

如果你是組長，就這麼做

- 先把「公告1發布」、「公告2發布」、「賽事手冊發布」、「進駐現場」的日期寫出來，倒推決定自己這一組的截止日
- 在分配當天的角色之前，先列出「當天之前要做好哪些東西」的清單

2 一旦公布的事就不更改



公布之後就上鎖

①在第1部最先提出的問題，就是「公布的重大性」。取消攤位、更改抵達出發區的時刻——一旦更改已經對外公布的資訊，參加者早已據此安排行程，會造成很大的困擾。所以，公布之前要把內容完全定案。③把這一點寫成了實務規則：「出發名單和賽事手冊，刊出後原則上不得更新。尤其出發時刻絕不能改。」②談的不是對參加者、而是營運內部的事，但把「決定事項而非討論」固定在紙上、讓任何人都能查閱，是同樣的想法。

- ① 公布前先確定。「沒定案就先開跑」是麻煩的根源
- ② 決定了的事寫進「核心文件」固定下來，並共享
- ③ 刊出後非改不可時，把更改處標示出來，並在官方公告板同步公告

如果你是組長，就這麼做

- 要刊在賽事手冊上的本組資訊（到出發區的距離、引導標帶的顏色、補給點位置等），在稿件截止前和競賽負責人、營運負責人對讀確定
- 不要把「大概會這樣」寫進稿子。還沒決定的，先決定再寫

3 「誰・做什麼・何時」一個都不漏

	計畫	籌備	舉辦	賽後
出發	✓	✓		
終點	✓		?	
計算		✓		
總務	✓			

在「領域×階段」的表格裡找「空格」


①認為失敗的主因是「作業的遺漏與順序錯誤」。有個有名的故事：賽前一天，出發組組長大喊「步測區間忘記做了！」手冊裡連立牌的規格都寫了，卻沒有「做步測區間」這項作業本身。於是①提議，做一張直軸是「領域」（出發、終點、成績計算中心，還有人事・總務・會計等後勤）、橫軸是「階段」（計畫、籌備、舉辦、賽後、評估）的表，把需要的作業全部寫出來。實際做了之後，據說有大約900項。

②從「責任」的一側解同一個問題。一項作業只有一位負責人（單一職責原則）；同一件事不寫在兩份文件裡（DRY原則）。因為寫在兩處，「哪個才對？誰來做？」就模糊了。③則一個一個指出容易漏掉的地方：「要明確負責人」、「收點分配常常忘記分派，要注意」。①的第4部也有同樣的話：很多人一起做地圖調繪，就不知道誰調繪了哪裡，對這種匿名性的依賴會產生偷工減料，所以要把各組的分擔圖印在地圖上，寫出負責人的名字。

如果你是組長，就這麼做

- 把本組的作業分成「籌備期／前一天／當天早上／競賽中／收點撤場」全部寫出來。不要只寫當天的作業就滿足
- 每項作業只寫一位負責人。「大家一起」等於沒有人做
- 做器材清單，分成「自製／事先購買／現場購買」（③）

4 先決定組與組之間的「接縫」



先決定出入口，再談內容

部門是黑箱。給箭頭取名字


①的第3部有這麼一段。報到組原本計畫把「最後出發時刻」通知出發組，但出發組真正需要的是「最終報名人數」。前提的資訊沒有進來，出發組準備好的整套安排就完全動不了——。①把這叫做「介面錯誤」，說它是手冊缺陷中最嚴重的一種。所以，在做各組的內容之前，要先在組與組之間決定「交什麼・何時・交給誰」。就像地圖調繪時，要先和相鄰的負責人「對邊界」一樣。

②把這表述為從「緊耦合」走向「鬆耦合」。不是「全員讀完所有郵件才能行動」的狀態（緊耦合），而是「每位負責人都有寫在紙上的決定事項，看了就能行動」的狀態（鬆耦合）。事先設計好「報名受理→競賽負責人→器材負責人」的資訊流。③以報名資料為例警告：各組各自持有不同的名單，就會發生「成績計算中心的資料和公布的出發名單不一樣」的事故。三份文件都拿報名資料當例子並非巧合，因為這裡是資訊交接最多的地方。

如果你是組長，就這麼做

- 把「進入本組的物品・資訊」和「離開本組的物品・資訊」，連同對方的組別和時刻寫在紙上，和對方組長對過
- 不要自己複製一份報名名單。去看「由某人管理的唯一那一個檔案」

5 定期檢查進度與成果的品質



把做完的格子塗掉。懷疑空白，也懷疑「太快」

讓進度看得見

①這套連載裡，有一部沒有放上網路的第4部「超」調繪論。它談的是大批學生一起做地圖調繪的年代，前提和現在的製圖（雷射測量的底圖、OCAD、委託專業者）不同，但裡面寫的「思考方式」可以直接用在組的工作上。集體調繪必然發生兩個問題：過了截止日，才發現根本沒進度；事後一看，是派不上用場的調繪。兩者的問題都在「發現得太晚」，所以要**早期發現、早期治療**——在變成那樣之前，就建立定期檢查進度與品質的機制，這是第4部的主張。

工具很簡單：準備一張畫了250公尺見方網格的地圖，做完的格子就用螢光筆塗掉。沒進度，不是在偷懶就是卡住了，所以派人支援或換負責人。反過來，「快得異常」也別高興，要懷疑偷工減料。這是第2部矩陣「消化率」的調繪版。③把同樣的事寫成執行委員長的工作：「必須檢查所有工作，落後就要指出，但真的危急時就得整個接手。一定


會有某個地方、某個人卡住。」②也把最上層的角色定為：執行委員長・營運負責人・競賽負責人看過所有往來，檢查遺漏與矛盾。

- ① 早期發現、早期治療。定期檢查進度與精度。太快的進度也要懷疑
- ② 最上層（執行委員長・營運負責人・競賽負責人）監看所有往來，檢出遺漏與矛盾
- ③ 一定會有某個地方、某個人卡住。檢查、指出，最後親自接手

如果你是組長，就這麼做

- 在第3課做的作業清單上加一欄「完成」，每週親自塗一次。空白連成一排的負責人，主動去問問
- 「已經做好了」交得越早的成果，越要看內容（和③說的競賽負責人・賽事顧問的檢查一樣）
- 截止前先說「做到一半也好，給我看看」。截止當天才第一次看，最危險

6 記錄下來，交給下一個人



一結束就用紅筆修改

①第5部從「沒有捲尺！」這個小事件開始。往下挖，藏著手冊不完備、檢討會不足、交接有問題等結構性原因。出發名單左右顛倒的失誤，在15年的歷史裡重複了好幾次。①的結論是：「把經驗確實變成自己的東西。這樣就能把運氣和個人差異的影響降到最低。」具體來說：賽事一結束就用紅筆修改手冊；報告書「照實」寫；把報告書和手冊合訂一冊發下去。而且它說，檢討不是回頭看，而是改善看得見的「創造性過程」。

- ① 收集資料。「沒有資料，就連有問題這件事本身都察覺不到。」第4部在會場設地圖客訴窗口，請大家寫在空白地圖上。第5部結尾的格言「海邊的沉船……」出自軟體工程經典《人月神話》（日文舊譯《ソフトウェア開発の神話》）第1章的章首；第4部的「延人數這個魔物」也是同書第2章的章名
- ② 核心文件是持續更新的記錄。新成員在啟動會議上共享進行方式
- ③ 組長依據交接文件製作分組手冊。最後「寫下交接與檢討，傳給下一次」

如果你是組長，就這麼做

- 拿到去年的分組手冊，先從「和今年不同的地方」做記號開始
- 當天遇到的困難、順利的地方，當場記下來。賽後一週內修改手冊，交給明年的組長
- 出發格的處理時間、讀卡處的等候人數等，數得出來的就先數起來

7 組長不是「動手做的人」，而是「決定並傳達的人」



把「這一組要這樣做」說出口

舉著旗子，指出方向

三份文件描繪的執行委員長形象，說法不同，方向卻一致。①推薦「策略性賽事營運」——把想辦成什麼樣的賽事化為語言，對內對外宣示。早大OC賽事的「Orienteer Oriented——想辦一場讓人開心的賽事」就是例子。②指出執行委員長容易變成「道歉專員」，而他本來應該是理念與規格的最終負責人、製作人。③更直接：「營運人員超過20人之後，賽事負責人的工作就變成什麼都不做。」工作來了就派給自己以外的人，掌握誰在做什麼，這才是他的職責。

這對組長同樣適用。不是自己動手最多，而是決定本組的方針、傳達給成員、找出遺漏的人。②的「溝通層級」把組長的責任定義為「確實掌握並發送與本組相關的事項」。

如果你是組長，就這麼做

- 能用一句話說出「今年的出發組最重視○○」（例如「不讓任何人遲到出發」、「縮短每個人的等候時間」）
- 當天自己的崗位設在「走得開的地方」。黏在一分鐘前的出發格，就看不見整體
- 聯繫原則上在組長之間、或與核心幹部之間進行（③）。建立成員不會擅自和其他組交涉的機制

附帶一提：三份文件共同重視的另一件事。那就是「在地」。①說「沒有在地的同意就辦不了賽事」；③甚至寫到步驟：到公所或地方會議說明、帶伴手禮登門拜訪、結束後寫感謝函。③還有這樣的警告：試跑時偶然遇到當地人，如果營運人員說明不了什麼是定向越野、這是什麼賽事，最糟的情況會變成辦不成。**組長也一樣，被問到時，要能用自己的話說明賽事的概要。**

第2章 三份文件有什麼不同？——各自的拿手絕活

前面看的是說同一件事的部分，但三份文件各自「看的高度」不同。①從上空看整體，②看團隊裡的線路，③看地面上的步驟。遇到困難時該翻哪一份，就由這個差異決定。

① 賽事營運學

從上空看：為什麼會失敗、怎麼培育賽事
作業總表・介面・記錄與檢討・概念


② PM研習資料

看團隊內部：責任・決定事項・聯繫的流向怎麼設計
核心文件・單一職責・鬆耦合・不增加人數・不增加規格

③ 舉辦手冊

看地面：何時・做什麼・多少錢・多少人
對外協調・申請・公告1/2・器材清單・分組・停辦基準・調查申請與申訴

① 賽事營運學——讓你思考「根本問題」的文件



用箭頭讓「等待結果」看得見


①獨有的特色，是把賽事營運整個當成一個「系統」來看。做好把作業全部寫出來的表（矩陣）之後，下一步是用箭頭把它們連起來，畫成「哪項作業在等哪個結果」的圖。路線沒確定就寫不了賽事手冊的稿子，試跑沒結束路線就確定不了……把這些相依關係讓全員共享，延誤的影響範圍就看得見。三份文件之中，提議把作業之間的關係畫成圖的，只有①。

另一個是「培育」的視角。第6部說，點子誕生於「需求（困擾）」與「種子（可以當作種子的技術或物品）」的相遇，是平日努力的產物而非天分；第7部則論述，點子只是局部的戰術，要有整場賽事的「概念」才能發揮。②③的目標是「順利辦完今年的賽事」，只有①在談跨越多年賦予賽事個性、在繼承傳統的同時求新。

「賽事的手冊，是手冊兼『賽事的設計圖』。」可是現有的手冊「只畫了各個房間的內部裝潢，卻沒有像樣的平面圖與外觀圖」。

——①第3部的比喻。意思是：在分組手冊（裝潢）之前，先畫組與組之間的平面圖

② 賽事營運的專案管理——逃出「電子郵件地獄」的方法




從討論的圈子，走向查閱決定事項

②的核心是「核心文件 (core paper)」：每位負責人各持一張的「決定事項與暫定計畫的紙」，營運負責人是甘特圖，競賽負責人是布點計畫圖，器材負責人是備品清單，人事負責人是時間表，報名負責人是報名名單。②把被電子郵件往來搞得筋疲力盡的原因，診斷為「不全員討論就無法前進的緊耦合狀態」，並建議轉向各自看了決定事項就能行動的「鬆耦合狀態」。溝通，說到底就是「更新核心文件的作業」。它還提到實作的訣竅：放在雲端（OneDrive、Google雲端硬碟等）讓大家隨時看得到最新版，並整理成表格或圖。

另一個只有②才有的主張是「不增加」。人數一多，聯繫成本膨脹，也會變得沒人負責（布魯克斯定律）；規格一多，負擔呈指數增加（KISS原則）。分割出發區、多種比例尺、複雜的頒獎、巴士接駁……「真的需要嗎？」先停下來想一想——這種減法的思維，①③都沒有。評價電子郵件、Slack、LINE、Zoom各自怎麼用的，也只有②。

③ 定向越野賽事舉辦手冊——數字和步驟全都有的文件



行情、人數、時間都寫了

③的特色就是具體。賽區大小與比例尺、製圖每公頃的單價、租借社區活動中心的行情、傷害保險每人的單價、一台噴墨印表機一小時能印幾張與錯誤率、封裝地圖的速度、租Hiace廂型車的費用、暑熱指數（WBGT）31°C以上就停辦、打雷就停辦——這些數字只有經歷過的人才寫得出來。把數百人規模的賽事當天所需的人員（會場・出發・終點・成績計算中心・補給救護約30人）連同角色寫出來的，也只有③。

還有①②不處理的「舉辦判斷之前」的世界：尋找賽區、掌握土地所有者的困難、叫做「版權」的默契、日本學生定向越野聯盟的新製圖事業、向縣協會與地區學聯的申請、賽事顧問的找法、企畫書該寫什麼。以及當天安全與公正的制度——停辦的判斷基準、「調查申請與申訴」的機制、委託裁定委員的方法。引用競賽規則中公告與賽事手冊必載事項的，也只有③。

③的「數字簿」——從原文摘錄組長用得到的數字

- 當天的人員（數百人規模的最低限度）：會場除三大幹部＋顧問4人外，會計・報到4～5人；出發7人（賽道數＋3人是最低限）；終點4人；成績計算中心3人；補給救護4人。合計約30人
- 事前準備的速度：一台噴墨印表機地圖每小時20～30張，錯誤率1～3%。「無論如何都不要把檔案分開。一次、一口氣印完。」封裝地圖快的人每小時100張，一般人30～40張。號碼布用雷射印表機每小時300張，防水紙每張25～40日圓
- 布點與確認：布點兩人一組，全部要預留2小時。全點確認由競賽負責人與賽事顧問兩人一組跑40～60個檢查點，10公里、3～4小時
- 保險：只保賽事當天的傷害保險，參加者・營運人員每人每天20～100日圓
- 停辦的判斷：氣象廳的預報在5時、11時、17時發布。停辦就在5時10分前於網站通知。打雷停辦、大雨警報・暴風警報停辦、暑熱指數（WBGT）31℃以上停辦、出現熊停辦、虎頭蜂則縮短路線
- 收點時最容易忘記分派的：出發旗，以及從出發區到出發旗的引導（競賽結束前不得撤收）

——摘自③第2章「人員分配」、「事前準備」，第3章「前一天白天要在現場做的事」、「確保安全」、「舉辦判斷」、「收點撤場」

「像拼圖一樣組合人與器材，規劃出需要的時候、需要的人和物都在適當位置的計畫，是營運負責人的醍醐味。」

——③第2章「製作進駐現場的時程」。①的網路圖和②的時間表，最後都會變成這一張表


遇到困難時，翻哪一份？

這種時候	翻哪一份	看哪裡
想做本組的作業清單，卻不知道該寫什麼	③ → ①	從③的第2、3章檢出作業的實體，再用①第2部矩陣的想法分「階段」找遺漏
和其他組的聯繫對不上，資訊沒進來	①	第3部「先決定介面」
群組的郵件和LINE太多，不知道決定了什麼	②	核心文件、緊耦合與鬆耦合、各種工具的分工
想估算費用和人數	③	第1章「會計」，第2章「人員分配」、「確保器材」
當天天氣好像不好。停辦怎麼判斷？	③	第3章「舉辦判斷」（預報發布時刻、警報、WBGT）
快到截止日才發現「其實根本沒進度」	①	第4部「檢查與跟催的體制」、「檢查進度」
重蹈了去年的覆轍	①	第5部「記錄與檢討」
被問「今年要辦一場什麼樣的賽事？」	①	第6部「點子」、第7部「概念與認同」
想做的事太多，忙不過來	②	「規格單純化」、「人數適正化」——不增加的勇氣

第3章 組長的一年——用「賽事營運全貌圖」來看

最後，把7堂課和三份文件放進一年的流程裡，看看怎麼用。基礎是下一頁的「賽事營運全貌圖」。這是①的作者¹在2026年為了確認①的「階段」想法（不用日曆日期，而以「公告發布」、「賽事手冊發布」、「進駐現場」等營運上的節點來劃分）和現行賽事總監（Event Director）研習教材裡的工作流程確實吻合而做的一張表。左半是①的階段，右半是研習教材的工作流程，你接下來會遇到的詞——公告（Bulletin）、賽事顧問（Event Adviser）、檢核・核准——都直接出現在上面。


怎麼讀這張圖——三個重點

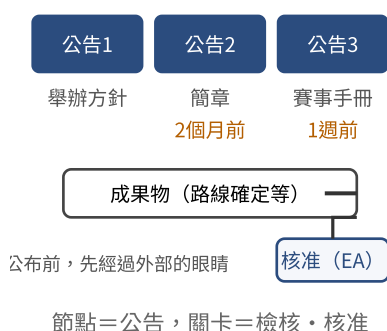

1・節點用「公告（Bulletin）」來數。公告1是計畫書（舉辦方針），公告2是簡章（2個月前），公告3是賽事手冊（1週前）。和③所說的「公告1・2・3」相同，期限由競賽規則決定。也就是說，第1課的「期限是被給定的」，內容就是這個。另外，圖中的「公告1.5」（公告發布前宣傳賽事的階段）是配合第45屆Sans Souci賽事的實際情況補寫的，並非每場賽事都有。

2・「公開資訊」這一欄，是第2課的實體。哪個階段對外公開什麼——只有舉辦方針，接著是競賽概要與報名資訊，接著是競賽細節與當天的周知事項，當天是地圖和路線，賽後是最終成績——公開的資訊一步步變細。賽事規模到簡章階段為止是「未定」，到賽事手冊階段「確定」。知道本組的資訊會刊在哪一份公告上，就知道什麼時候之前該確定什麼。

3・橙色的框，以及右側的「檢核」「核准」，是無法回頭的關卡。橙色的框（簡章、路線確定、賽事手冊、正式成績）是對外公開的成果物，過了這裡就不能回頭。所以今天它們也成了賽事顧問（EA）檢查的對象。路線印製和檢查點布設也要接受檢核・確認。你這一組的成果物，也會通過這些關卡的某一個。第3、4課做完「決定負責人」、「決定接縫」之後，第5課的「誰、什麼時候檢查」已經以制度的形式決定好了。

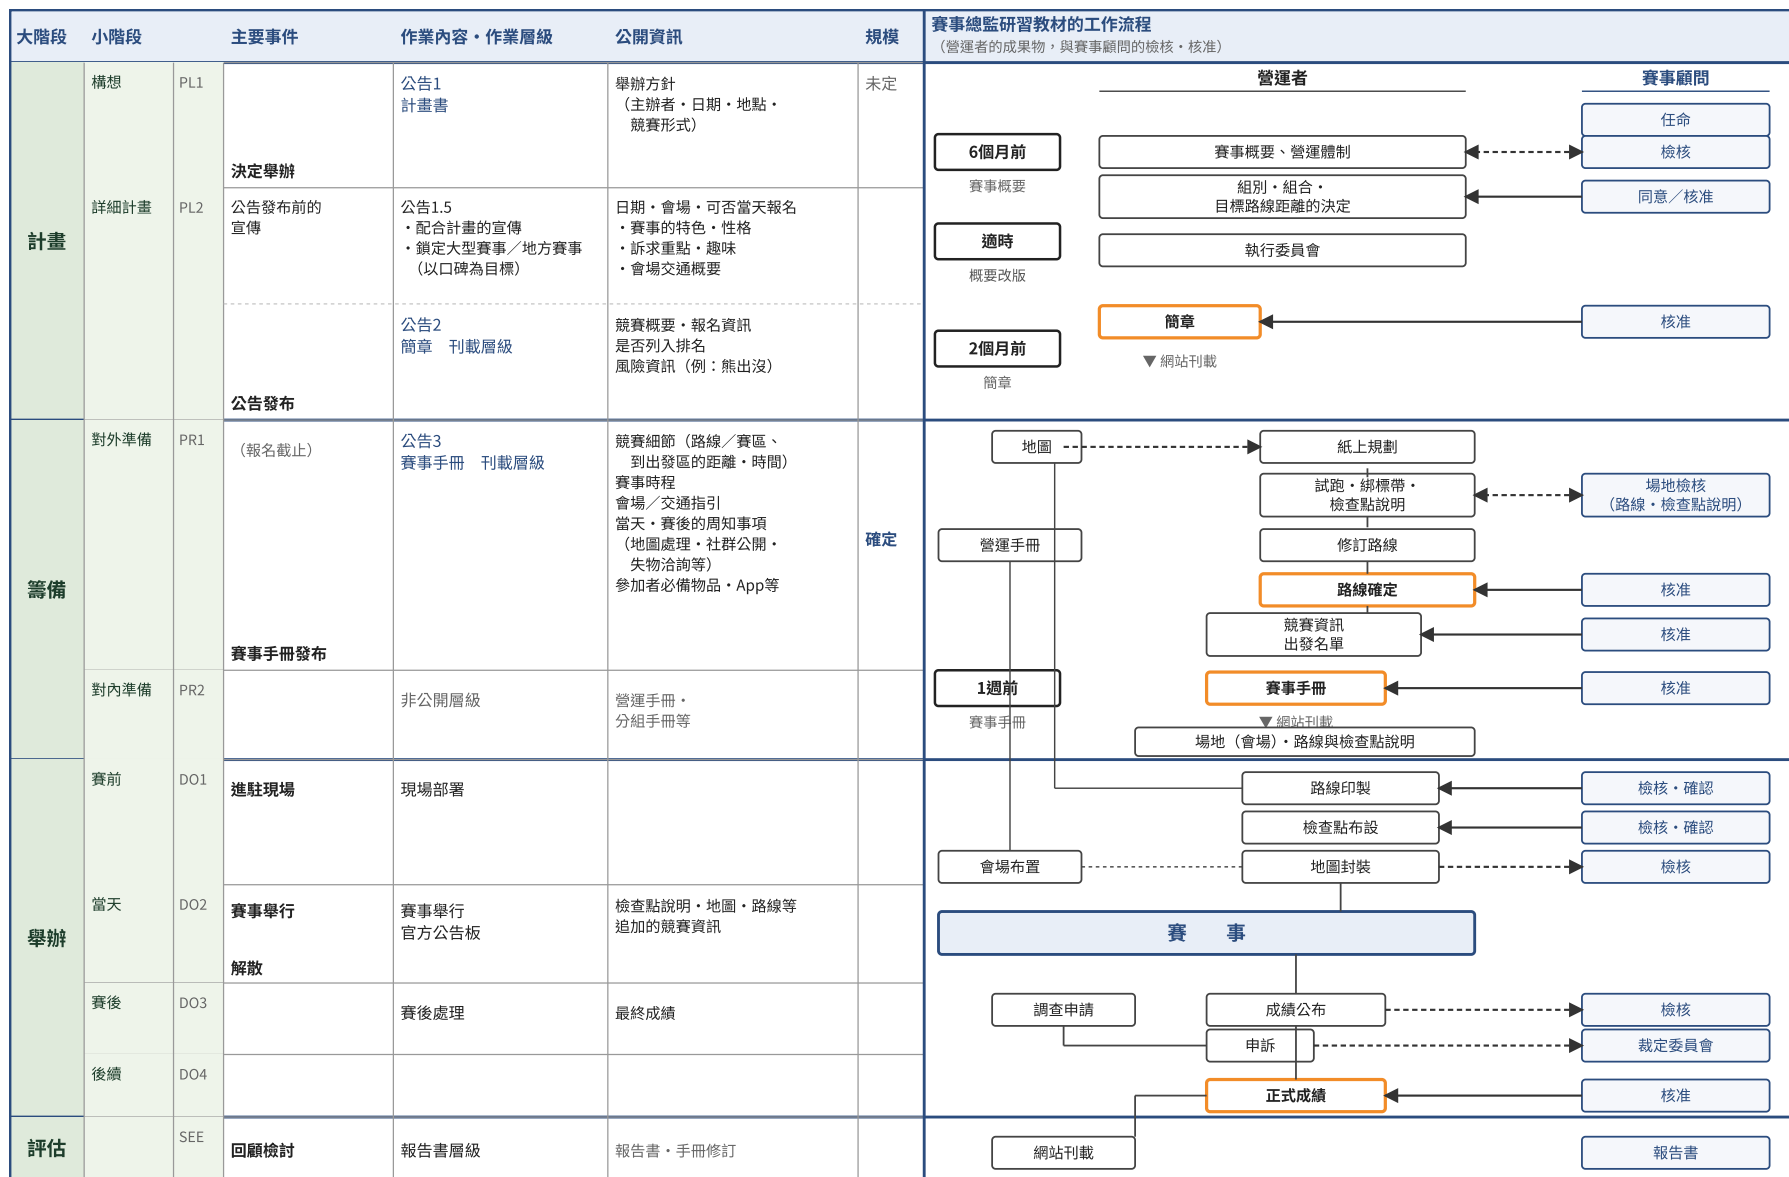

各階段，組長要做的事

沿著圖左側的「階段」，排列7堂課（L1～L7）和三份文件的用處。天數的參考來自③：300～500人規模的賽事從半年前、100人規模從2～3個月前開始談招募參加者。

計畫（PL1・PL2） 決定舉辦～公告2（簡章）

拿到去年的分組手冊和報告書來讀（L6）。向營運負責人問清公告1・2・3和進駐現場的日期，倒推自己這一組的截止日（L1）。勘查和試跑盡量參加。③說：「看過現場，就會清楚知道賽事還能在哪裡多下功夫。」要刊在簡章上的本組資訊（出發區的位置等），在這個階段通過EA的核准。

準備・對外（PR1） 簡章～公告3（賽事手冊）

把本組的作業依階段全部寫出來，每一項都指定負責人（L3）。和相鄰的組用紙對過「交什麼・何時・交給誰」（L4）。想像成以組為單位，持有一張②所說的「核心文件」。做器材清單，確定所需人數。依③的參考，出發區「賽道數+3人」是最低限。每週至少看一次作業清單的消化率，對落後的作業採取行動（L5）。要刊在賽事手冊上的本組記載，和競賽負責人對讀確定（L2）——這是接受EA核准的最後一項公開資訊。

準備・對內（PR2） 賽事手冊發布～進駐現場

賽事手冊發布後就不改（L2）。從這裡開始是「非公開層級」的準備，也就是完成分組手冊。請成員讀過，在前一天之前做模擬演練，讓每個人記住當天的動作（③）。用一句話把本組的方針講清楚（L7）。

舉辦・賽前（DO1） 進駐現場

布點、全點確認、地圖封裝、會場布置。如圖右側所示，路線印製和檢查點布設會有EA的檢核・確認。布設的東西全部記錄下來，分派收點的負責人（L3）。

舉辦・當天（DO2） 賽事舉行～解散

從晨間確認開始，在官方公告板發布追加的競賽資訊。組長待在走得開的地方，聯繫在組長之間、或與核心幹部之間進行（L7）。遇到的困難、順利的地方當場記下（L6）。收點時「出發旗，以及從出發區到出發旗的引導，競賽結束前不得撤收」（③）——這是最常忘記分派的項目。

舉辦・賽後～後續（DO3・DO4） 成績公布～正式成績

公布成績，若有調查申請・申訴則處理（③），正式成績的核准與網站刊載。以組而言，借來的器材洗淨、清點、歸還，並結清代墊款。

評估（SEE） 回顧檢討

一週內用紅筆修改分組手冊。把蒐集到的資料和數字補上去。報告書「照實」寫。然後交給明年的組長（L6）。借①的話來說，這就是「資訊的子孫繁衍、物種保存」。

附錄1 組長的檢查清單

籌備期間

- ☐ 讀過去年的分組手冊和報告書
- ☐ 知道公告1、公告2、賽事手冊、進駐現場的日期
- ☐ 把本組的作業依階段全部寫出來了
- ☐ 每一項作業都有一位負責人
- ☐ 和相鄰的組確認過「進來的／出去的」，含時刻
- ☐ 做了器材清單，分成「自製／事先購買／現場購買」
- ☐ 算出所需人數，告訴了營運負責人
- ☐ 每週檢查一次作業清單的「完成」欄
- ☐ 要刊在賽事手冊上的本組記載，和競賽負責人對讀過
- ☐ 把分組手冊發給成員，做了模擬演練

當天・賽後

- ☐ 用一句話把本組的方針告訴了成員
- ☐ 自己待在「走得開的地方」
- ☐ 記錄了所有布設的東西，分派了收點負責人
- ☐ 記下了遇到的困難和順利的地方
- ☐ 數了數得出來的東西（處理時間、等候人數等）
- ☐ 一週內用紅筆修改了手冊
- ☐ 報告書「照實」寫了
- ☐ 交給了明年的組長

附錄2 三份文件用語小辭典

階段（工程）（①） 不用日曆日期，而以「公告發布」、「賽事手冊發布」、「進駐現場」等營運上的節點劃分的時間區分。計畫・籌備・舉辦・賽後・評估五個階段。

作業矩陣（①） 直軸領域、橫軸階段，把需要的作業全部填進去的表。找遺漏的工具。

網路圖（①） 用箭頭把作業連起來，顯示「哪項作業在等哪個結果」的圖。源自名為PERT的進度管理方法。

介面（①） 部門與部門的接點。在那裡交接的物品・資訊及其時刻。

早期發現・早期治療（①第4部） 在壞結果出現之前，就定期檢查進度與品質並採取行動。用螢光筆塗網格地圖讓進度看得見。

傾斜調繪法（①第4部） 賽事會用到的重要部分仔細調繪、其他部分適可而止的優先順序。精度低的部分在路線上避開。

需求與種子（①） 困擾（needs），與可以當作種子的技術或物品（seeds）。兩者相遇，點子就誕生。

策略性賽事營運（①） 想辦成什麼樣的賽事對內對外都很明確，所有部門朝著它一致努力的狀態。

核心文件（core paper）（②） 每位負責人各持的「決定事項與暫定計畫書」。寫的不是討論，而是決定了的事。

緊耦合／鬆耦合（②） 不全員討論就無法前進的狀態／各自查閱決定事項就能行動的狀態。

單一職責原則・DRY（②） 一項作業只有一位負責人。同一件事不寫在兩個地方。

KISS・布魯克斯定律（②） 規格盡量簡單。增加人手也會因聯繫成本而快不起來。

三大幹部・核心幹部（③） 執行委員長・營運負責人・競賽負責人是三大幹部。加上調繪・對外協調・宣傳・會計的負責人，就是核心幹部。

公告1・2・3（Bulletin）（③・全貌圖） 公布時間與地點（計畫書）／開始受理報名＝簡章（2個月前）／賽事手冊（1週前）。③稱之為「要項1・2・3」，研習教材稱為Bulletin。全貌圖的「公告1.5」是配合第45屆Sans Souci賽事補寫的，並非通例。

PL・PR・DO・SEE（①・全貌圖） 階段的代號。計畫（PL1構想・PL2詳細計畫）、準備（PR1對外・PR2對內）、舉辦（DO1賽前・DO2當天・DO3賽後・DO4後續）、評估（SEE）。

檢核・核准（全貌圖） 營運者的成果物接受賽事顧問檢視的關卡。公開後無法回頭的成果物（簡章・路線確定・賽事手冊・正式成績）是核准，路線印製・檢查點布設是檢核・確認。

EA（賽事顧問，Event Adviser）（③） 從外部邀請的監督者。舊稱Controller。

全點確認・晨間確認（③） 布點後把所有檢查點跑一遍確認／當天早上確認過了一夜是否仍無問題。

調查申請與申訴（③） 參加者對競賽公正性提出疑義時的程序。由3名裁定委員與EA裁定。

③的引用與摘要已獲作者坂野翔哉先生同意（2026年9月）。①的第4部「超」調繪論（O-Japan 1994年10月號）未於網路公開，依作者提供的原稿。「賽事營運全貌圖」依池ヶ谷悅朗「賽事營運全貌」（2026年7月）及賽事總監研習教材的工作流程圖重新繪製。其他插圖皆為本教材專門繪製。本中文（台灣）版由日文原版翻譯（2026年9月）；三份原始文件皆為日文，引文為譯者自日文轉譯。
